

***Stan realizacji projektów dotyczących  
budowy sieci Internetu szerokopasmowego w  
poszczególnych województwach  
wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013***

**Aleksandra Kwiatkowska**

Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji  
Programów Regionalnych i Cyfryzacji  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Gdańsk, 20 czerwca 2013r.

- 1. Program Operacyjnych Rozwój Polski  
Wschodniej –  
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej***
- 2. Regionalne Programy Operacyjne***
- 3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka***

***1. Program Operacyjnych Rozwój Polski  
Wschodniej –  
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej***

# Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej



Projekt	Długość sieci światłowodowej	Całkowita wartość projektu	Wartość dofinansowania z EFRR
SSPW woj. lubelskie	2 908 km	385 mln zł	267 mln zł
SSPW woj. podkarpackie	2 006 km	295 mln zł	204 mln zł
SSPW woj. podlaskie	1 852 km	251 mln zł	174 mln zł
SSPW woj. świętokrzyskie	1 410 km	201 mln zł	139 mln zł
SSPW woj. warmińsko-mazurskie	2 241 km	327 mln zł	226 mln zł

**Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ma liczyć ponad 10 417 km** (długość na podstawie najnowszych wersji studiów wykonalności). Całkowita wartość projektów to 1,459 mld zł, a kwota dofinansowania z EFRR to 1,010 mld zł.

# Wybrane modele realizacji projektów SSPW




- **Model podstawowy** – uruchomione zostaną procedury zamówień publicznych na projekt i budowę infrastruktury szerokopasmowej, a w drugiej kolejności – w ramach oddzielnej procedury – nastąpi wybór partnera prywatnego (operatora infrastruktury), któremu będzie dzierżawiona sieć i powierzone jej funkcjonowanie.
- **Model alternatywny** (DBO - *design-built-operate*) - partner prywatny jest wyłaniany w ramach jednej otwartej procedury i odpowiada za zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację sieci (woj. podlaskie i podkarpackie).

# Stan realizacji projektów SSPW



- Zakończono proces **notyfikacji pomocy publicznej w KE** w projektach SSPW – 10 listopada 2011 r. (decyzja notyfikacyjna).
- Województwa uzyskały pozytywne decyzje KE zatwierdzające wkład finansowy dla dużych projektów.
- Województwa przeprowadziły postępowania i zawarły **umowy na doradztwo** prawne i doradztwo techniczno-ekonomiczne.

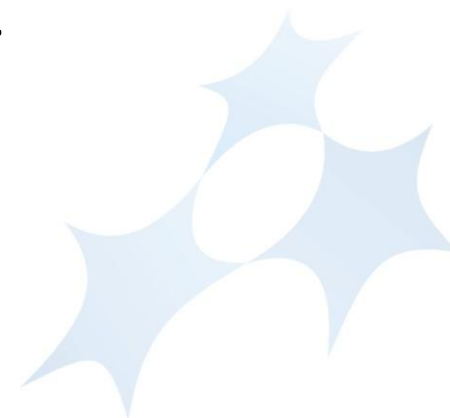

# Stan realizacji projektów SSPW



- **Wybór Inżyniera Kontraktu**

- 4 czerwca 2012 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu w województwie warmińsko-mazurskim,
- 26 listopada 2012 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu w województwie świętokrzyskim,
- 26 lutego 2013 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu w województwie podlaskim,
- 14 marca 2013 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu w województwie podkarpackim,
- 18 czerwca 2013 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu w województwie lubelskim.

# Stan realizacji projektów SSPW



- **Wybór Wykonawcy Infrastruktury/partnera prywatnego** - wszystkie województwa ogłosiły postępowania na wybór wykonawcy sieci/partnera prywatnego
  - Województwa warmińsko-mazurskie, lubelskie i podkarpackie ogłosiły postępowania w formie dialogu konkurencyjnego:
    - Województwo warmińsko-mazurskie podpisało umowę z partnerem prywatnym w dniu 19.04.2013 r.
    - Województwo lubelskie podpisało umowę z wykonawcą infrastruktury w dniu 22.05.2013 r.
    - Województwo podkarpackie jest w trakcie wyboru partnera prywatnego i przewidywana data podpisania umowy to 07/08 2013 r.





# Stan realizacji projektów SSPW



- Województwa świętokrzyskie i podlaskie ogłosiły postępowania w formie przetargu nieograniczonego:
  - Województwo świętokrzyskie podpisało umowy z wykonawcami infrastruktury w dniu 29.01.2013 r.
  - Województwo podlaskie podpisało umowy z wykonawcami infrastruktury w dniu 21.03.2013 r.
- **Wybór Operatora Infrastruktury (zaprojektuj i wybuduj):**
  - Województwa: lubelskie, podlaskie i świętokrzyskie planują wybór Operatorów Infrastruktury w 2013 r.

W chwili obecnej IZ PO RPW nie widzi ryzyka zwrotu środków do budżetu UE.


# Stan realizacji projektów SSPW - konkurs



Od dnia 3.06 do dnia 15.07 trwa przyjmowanie wniosków w konkursie na projekty z zakresu budowy sieci dostępowych.

Na dofinansowanie przewidziano kwotę ponad 55 mln EUR.

18.06.2013 r. odbyło się w Warszawie spotkanie informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów. Organizowane są także spotkania regionalne.



## *2. Regionalne Programy Operacyjne*

# Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych w ramach RPO o zasięgu regionalnym 1/3



- ❖ Ze względu na swoją skalę, wartość (łączna kwota dofinansowania z EFRR to ok. 1 mld zł) oraz zakładane wskaźniki w ramach RPO można wyróżnić 9 projektów (w tym projektów zakontraktowanych i oczekujących na kontraktację), w ramach których zakłada się utworzenie ok. 16,8 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnych:
- **Dolnośląskie** – „*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*” – projekt indywidualny o wartości ok. 215 mln PLN, projekt będzie realizowany do 31.01.2015 r. Projekt zakłada budowę 1500 km sieci. Umowę na budowę z wykonawcą podpisano 28.02.2013 r. Podpisano umowę z inżynierem kontraktu 23.05.2013. Trwają także przygotowania do wyboru operatora infrastruktury.
- **Lubuskie** - "*Szerokopasmowe lubuskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim*„ - projekt konkursowy o wartości ok. 152,10 mln PLN, projekt będzie realizowany do 30.06.2014 r. Zakłada powstanie 1 449 km sieci. Umowa z beneficjentem (TP SA) podpisana została 31.12.2010 r. Wybrano wykonawcę i inżyniera kontraktu. Prace budowlane trwają od 08.2012 r. i mają zakończyć się 06.2014 r.

## Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych w ramach RPO o zasięgu regionalnym 2/3



- **Łódzkie:**

- *„Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – etap I”* – projekt regionalny, konkursowy o wartości 71,86 mln PLN, projekt jest realizowany w terminie 01.05.2010-15.12.2013 r. Projekt zakłada budowę 416 km sieci. Od 2011 r. trwa pilotażowa budowa sieci WiFi. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę całego projektu.
- *„Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – etap II”* – projekt regionalny, konkursowy o wartości 25,86 mln PLN, projekt jest realizowany w terminie 30.04.2012-30.12.2014 r. Projekt zakłada powstanie 860 km sieci. Obecnie trwa procedura notyfikacji pomocy publicznej w KE. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu notyfikacji.

- **Małopolskie** – *„Małopolska Sieć Szerokopasmowa”* – projekt indywidualny o wartości 193 mln PLN, projekt jest realizowany w terminie 01.12.2012 – 30.06.2015. Projekt zakłada powstanie ponad 3000 km sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Podpisano preumowę (10.07.2012 r.), a do 07.2013 ma zostać podpisana właściwa umowa.

- **Mazowieckie** - *„Internet dla Mazowsza”* – projekt indywidualny o wartości 493 mln PLN, realizowany w terminie 01.01.2011 – 31.12.2014. Zakłada powstanie ponad 3 600 km sieci. Umowę o dofinansowanie podpisano 28.09.2011 r. Projekt otrzymał pozytywną notyfikację KE 29.10.2012 r. Wybrano inżyniera kontraktu. Wykonawca robót zostanie ostatecznie wyłoniony na przełomie 04-05.2013 r. Termin prac budowlanych – od III kw. 2013 r.

## Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych w ramach RPO o zasięgu regionalnym 3/3



- **Pomorskie** - *"Szerokopasmowe pomorskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego,,* - projekt indywidualny, konkursowy o wartości ok. 156 mln PLN, projekt będzie realizowany w terminie 10.2011 r. - 09.2014 r. Projekt zakłada powstanie ponad 1500 km sieci. Umowę o dofinansowanie z TP SA podpisano 29.02.2012 r. Rzeczowa realizacja rozpoczęła się 08.2012 r., a prace budowlane – 01.2013 r.
- **Śląskie** – *„Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”* - projekt konkursowy o wartości 68,82 mln PLN. Projekt będzie realizowany w terminie 30.06.2012r. - 30.06.2015r. Projekt zakłada powstanie ok. 500 km sieci. Notyfikację pomocy publicznej z KE otrzymano 19.10.2012 r. Umowę podpisano 7.02.2013 r. Wybrano inżyniera kontraktu. Termin wyłonienia wykonawcy robót – 06.2013 r., a przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - wiosna 2014 r.
- **Wielkopolskie** – *„Budowa Wielkopolskiej Sieć Szerokopasmowej”* – projekt indywidualny o wartości 407,11 mln PLN, projekt ma zostać zrealizowany do 31.12.2014 r. Zakłada powstanie 4000 km sieci (na podstawie umowy). Umowę o dofinansowanie podpisano 23.12.2010 r. Notyfikację pomocy publicznej uzyskano 23.05.2012 r. Uzyskano Completion Note od JASPERS i przesłano do KE wnioski o potwierdzenie wkładu dla projektu dużego. Podpisano umowę z inżynierem kontraktu. Trwa podpisywanie umów na realizację obiektu w 6 obszarach inwestycyjnych. Rozpoczęcie przetargu na zakup infrastruktury aktywnej – 09.2013 r.

# *3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka*

## Działanie 8.4 POIG - „Budowa sieci dostępu na etapie „ostatniej mili”



- **Alokacja** – 713.796.000 PLN
  - Zawarto 484 umów o wartości 694,32 mln PLN (dofinansowanie UE)
  - Zakończono realizację **33** projektów na kwotę dofinansowania z UE w wysokości 9,73 mln PLN.
  
- Zakończył się ostatni **konkurs** w działaniu trwający w terminie: 11.03.2013 - 5.04.2013
  - W ramach tego naboru złożono ponad 200 wniosków o dofinansowanie, na kwotę ok. 340 mln PLN.
  - Alokacja na konkurs wynosiła 65 mln zł, a jej wykorzystanie wyniosło ponad 500%.
  - Obecnie trwa ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.






# Problemy i dalsze działania

## Kwestie problemowe i wyzwania

- brak inwentaryzacji sieci na poziomie krajowym, przedłużający się proces notyfikacji pomocy publicznej, liczne zmiany modeli realizacji oraz przesuwanie terminów ogłaszania kluczowych postępowań doprowadziły do **opóźnień w realizacji projektów**
- brak decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnych sieci szerokopasmowych w większości projektów
- **najważniejsze zadania** dla beneficjentów:
  - wybór **wykonawcy sieci/partnera prywatnego**
  - **rzeczowa realizacja** projektu
  - **utrzymanie infrastruktury**

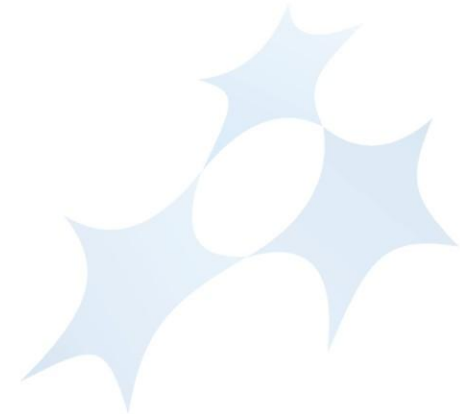

# Zagrożenia

- rok 2013 jest **krytycznym** dla realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych
- **dalsze opóźnienia** w realizacji działań w projektach będą powodowały:
  - skrócenie czasu na rzeczową realizację
  - jednoczesny wybór wykonawców sieci w kilku województwach może spowodować wzrost cen
- ostateczna data kwalifikowalności wydatków – **31 grudnia 2015 r.**
  - po tej dacie **projekty muszą być skończone** ze środków własnych beneficjenta
  - tylko w takim przypadku KE **nie zażąda zwrotu CAŁEGO DOFINANSOWANIA**

**Dziękuję za uwagę!**
